



Condições Técnicas e Operacionais

Technical and Operational Conditions

Proposta para Onesubsea | BID Freight Forwarder 2025
Proposal for Onesubsea | BID Freight Forwarder 2025

Apresentado por / Presented by:

PGL Brasil

Maio 2025 / May 2025



FILIAL GUARULHOS
+55 11 2445-5120

FILIAL SANTOS
+55 13 3279-3800

FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
+55 12 3939-4343

FILIAL VIRACOPOS
+55 19 3265-3011

Av. Chedid Jafet, 222 - Vila Olímpia, São Paulo
SP, 04551-065 - Bloco D - Conj 51 e 52





1.Introdução

Este documento detalha as condições técnicas e operacionais propostas pela PGL Brasil para o atendimento ao BID de Freight Forwarder 2025 da Onesubsea. O plano aqui descrito visa garantir a eficiência, a conformidade e o cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos para os embarques aéreos e marítimos originados da Europa, América e Ásia, com destino ao Brasil. A metodologia baseia-se nas etapas operacionais definidas no BID, conforme solicitado, e utiliza como referência os cronogramas operacionais detalhados nas tabelas abaixo.

This document details the technical and operational conditions proposed by PGL Brazil to meet Onesubsea's Freight Forwarder BID 2025. The plan described herein aims to ensure efficiency, compliance, and strict adherence to the established deadlines for air and ocean shipments originating from Europe, America, and Asia, destined for Brazil. The methodology is based on the operational steps defined in the BID, as requested, and uses the detailed operational schedules in the tables below.

2.Estrutura Operacional


A PGL Brasil dedicará uma estrutura operacional robusta para garantir a execução fluida e eficiente de todas as etapas do processo logístico da Onesubsea. Isso inclui equipe especializada, sistemas de gerenciamento e rastreamento de última geração, e comunicação proativa.

PGL Brazil will dedicate a robust operational structure to ensure the smooth and efficient execution of all stages of Onesubsea's logistics process. This includes a specialized team, state-of-the-art management and tracking systems, and proactive communication

2.1-Equipe Dedicada

A equipe dedicada ao projeto Onesubsea possui a seguinte estrutura hierárquica:

The team dedicated to the Onesubsea project has the following hierarchical structure:

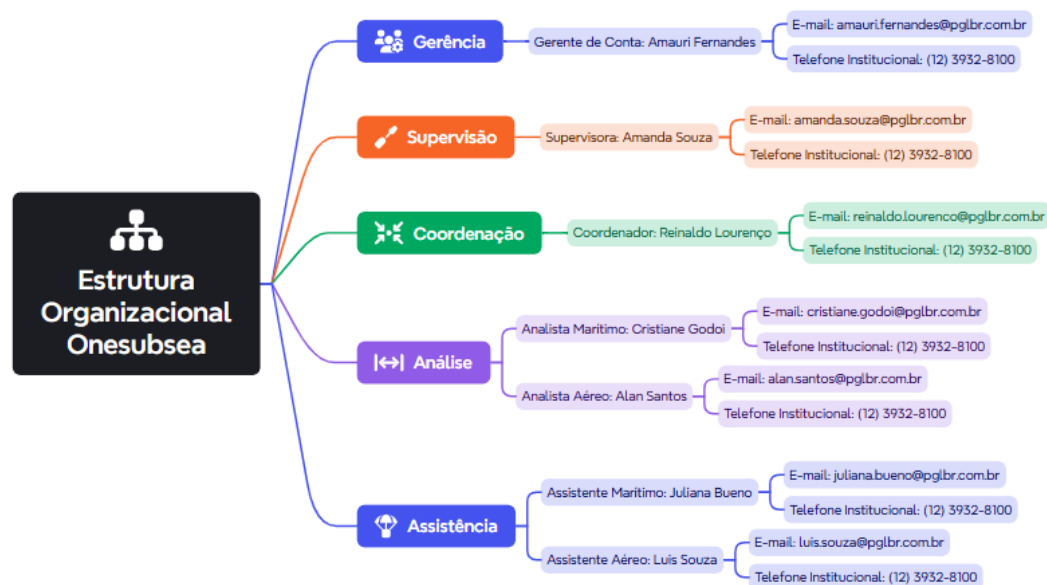

2.2-Entendimento do Escopo

Com base na análise detalhada da RFP e documentos relacionados, entendemos que o principal escopo dos serviços solicitados pela Onesubsea inclui resumidamente:

- Agenciamento de carga internacional para importação de materiais de diversos fornecedores globais para o Brasil.
- Modais de transporte incluindo marítimo (LCL, FCL - 20DRY, 40DRY/HC) e aéreo (Express, Economic).
- Origens globais, com destaque para Ásia (China), Europa (Reino Unido, Alemanha, Itália) e América do Norte (EUA).
- Destinos no Brasil incluindo Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, Guarulhos e Curitiba.
- Termos de transporte principalmente Door-to-Port.
- Coordenação com fornecedores, equipes de Procurement e COMEX da Onesubsea.
- Atualização constante da planilha de forecast fornecida pela COMEX.
- Conformidade com requisitos específicos, como ISPM 15 / MAPA para embalagens de madeira.
- Relatórios de emissões de CO2 utilizando a metodologia Well-to-Wheel (WTW).

Based on the detailed analysis of the RFP and related documents, we understand that the scope of services requested by Onesubsea includes:

- *International freight forwarding for the import of materials from various global suppliers to*



Brazil.

- *Transport modes including ocean (LCL, FCL - 20DRY, 40DRY/HC) and air (Express, Economic).*
- *Global origins, particularly Asia (China), Europe (United Kingdom, Germany, Italy), and North America (USA).*
- *Destinations in Brazil including Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, Guarulhos, and Curitiba.*
- *Transport terms primarily Door-to-Port.*
- *Coordination with suppliers, Onesubsea's Procurement and COMEX teams.*
- *Constant updating of the forecast spreadsheet provided by COMEX.*
- *Compliance with specific requirements, such as ISPM 15 / MAPA for wooden packaging.*
- *CO2 emissions reporting using the Well-to-Wheel (WTW) methodology.*

3.Principais Hubs Logísticos por Região

Para otimizar as operações e garantir o cumprimento dos prazos, a PGL utilizará hubs logísticos estratégicos em cada região de origem, selecionados com base em sua infraestrutura, conectividade e proximidade aos fornecedores da Onesubsea.

To optimize operations and ensure deadlines are met, PGL will utilize strategic logistics hubs in each region of origin, selected based on their infrastructure, connectivity, and proximity to Onesubsea's suppliers.

3.1- Europa

Noruega: Porto de Oslo, Aeroporto de Oslo Gardermoen (OSL)

Alemanha: Porto de Hamburgo, Aeroporto de Frankfurt (FRA)

Reino Unido: Porto Thurrock, Porto Grangemouth, Aeroporto de Londres Heathrow (LHR), Aeroporto de Manchester (MAN)

França: Porto de Le Havre, Aeroporto Charles de Gaulle (CDG)

Norway: Port of Oslo, Oslo Gardermoen Airport (OSL), Germany: Port of Hamburg, Frankfurt Airport (FRA), United Kingdom: Port Thurrock, Port Grangemouth, London Heathrow Airport (LHR), Manchester Airport (MAN), France: Port of Le Havre, Charles de Gaulle Airport (CDG)

3.2-América

Estados Unidos: Porto de Miami, Porto de Houston, Aeroporto Internacional de Miami (MIA), Aeroporto George Bush de Houston (IAH)

United States: Port of Miami, Port of Houston, Miami International Airport (MIA), George Bush Intercontinental Airport (IAH)



3.3-Ásia

China: Porto de Shanghai, Porto de Shenzhen, Aeroporto Internacional de Shanghai Pudong (PVG)

Hong Kong: Porto de Hong Kong, Aeroporto Internacional de Hong Kong (HKG)

Malásia: Porto Klang, Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur (KUL)

China: Port of Shanghai, Port of Shenzhen, Shanghai Pudong International Airport (PVG)

Hong Kong: Port of Hong Kong, Hong Kong International Airport (HKG)

Malaysia: Port Klang, Kuala Lumpur International Airport (KUL)

4.Cobertura Global e Expertise Local

A PGL combina uma rede internacional robusta com profundo conhecimento local para atender às necessidades específicas da Onesubsea.

Rede Internacional:

- Ásia: Forte presença na China (Shanghai, Hong Kong, etc.), com equipes dedicadas e relacionamento estabelecido com os principais carriers.
- Europa: Escritórios estratégicos no Reino Unido, Alemanha, Itália e outros países, com especialistas em cargas de projeto e equipamentos especializados.
- América do Norte: Presença nos principais hubs dos EUA (incluindo Houston e MIA), com expertise em exportação para o setor de óleo e gás e soluções aéreas expressas.

Expertise no Brasil:

- Portos e Aeroportos: Operações estabelecidas e relacionamento com autoridades em Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, Guarulhos, Curitiba e outros.
- Desembarço e Regulamentações: Equipe especializada em legislação aduaneira brasileira, requisitos do MAPA e outros órgãos anuentes, com acompanhamento constante de mudanças.
- Logística Doméstica: Rede de parceiros para transporte interno, soluções de armazenagem e coordenação eficiente para entregas finais.

PGL combines a robust international network with deep local knowledge to meet Onesubsea's specific needs.

International Network:

- *Asia: Strong presence in China (Shanghai, Hong Kong, etc.), with dedicated teams and established relationships with major carriers.*
- *Europe: Strategic offices in the UK, Germany, Italy, and other countries, with specialists in project cargo and specialized equipment.*
- *North America: Presence in major US hubs (including Houston and MIA), with expertise in exports for the oil and gas sector and express air solutions.*



Expertise in Brazil:

- *Ports and Airports: Established operations and relationships with authorities in Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá, Guarulhos, Curitiba, and others.*
- *Customs Clearance and Regulations: Specialized team in Brazilian customs legislation, MAPA requirements, and other consenting bodies, constantly monitoring changes.*

Domestic Logistics: Network of partners for internal transport, warehousing solutions, and efficient coordination for final deliveries.

5. Plano de Execução por Etapa

O fluxo operacional seguirá as etapas definidas no BID, com procedimentos claros para cada fase, garantindo a visibilidade e o controle total do processo.

The operational flow will follow the steps defined in the BID, with clear procedures for each phase, ensuring full visibility and control of the process.

Etapa 1: Recebimento da SI (Shipping Instructions)

Responsável Principal: Analista de Operações PGL

Procedimentos: Monitoramento contínuo da caixa de e-mail dedicada; Confirmação de recebimento em até 4 horas; Verificação da completude das informações; Análise preliminar do modal.

Ferramentas: E-mail dedicado, Checklist documental.

Main Responsible: PGL Operations Analyst Procedures: Continuous monitoring of the dedicated email inbox; Acknowledge receipt within 4 hours; Verify information completeness; Preliminary modal analysis. Tools: Dedicated email, Document checklist.

Etapa 2: Confirmação de Booking

Responsável Principal: Analista de Operações PGL por Região/Modal.

Procedimentos: Confirmação imediata do booking com a transportadora selecionada (aérea/marítima) após recebimento e validação da SI; Alocação de espaço/equipamento;

Prazos (Início Processo): Air - Dia 1 (AM /EUR/ASIA); Ocean - Dia 4 (Todas as Regiões).

Ferramentas: E-mail dedicado, Plataformas de booking das transportadoras.

Main Responsible: PGL Operations Analyst by Region/Modal. Procedures: Immediate booking confirmation with the selected carrier (air/ocean) after SI receipt and validation; Space/equipment allocation. Deadlines (Process Start): Air - Day 1 (AM) / Day 1 (EUR/ASIA); Ocean - Day 4 (All Regions). Tools: TMS System, Carrier booking platforms.



Etapa 3: Programação e Agendamento da Coleta

Responsável Principal: Analista de Operações PGL por Região.

Procedimentos: Contato com o fornecedor para agendamento da coleta (mínimo 3 tentativas em 4h); Confirmação de detalhes logísticos (data/hora, endereço, contato); Briefing com transportador local sobre requisitos da carga; Notificação à Onesubsea em caso de dificuldade de contato com fornecedor após 24h.

Prazos (Início Processo): Air - Dia 1 (AM/EUR/ASIA); Ocean - Dia 4 (Todas Regiões).

Ferramentas: Sistema de agendamento, Plataforma de comunicação, Registro de contatos.

Main Responsible: PGL Regional Operations Analyst. Procedures: Contact supplier to schedule collection (minimum 3 attempts within 4h); Confirm logistics details (date/time, address, contact); Brief local carrier on cargo requirements; Notify Onesubsea if supplier contact difficulties persist after 24h. Deadlines (Process Start): Air - Day 1 (AM) / Day 1 (EUR/ASIA); Ocean - Day 4 (All Regions) Tools: Scheduling system, Communication platform, Contact log.

Etapa 4: Confirmação de Coleta

Responsável Principal: Analista de Operações PGL por Região.

Procedimentos: Acompanhamento em tempo real; Confirmação com motorista/agente; Registro fotográfico (se aplicável); Envio de confirmação por e-mail à Onesubsea imediatamente após coleta; Atualização da planilha de *forecast*.

Prazos (Máximo): Air - Dia 2 (AM /EUR/ASIA); Ocean - Dia 6 (Todas Regiões).

Ferramentas: App móvel/confirmação transportador, Sistema de notificação, *Template* de e-mail.

Main Responsible: PGL Regional Operations Analyst. Procedures: Real-time monitoring; Confirmation with driver/agent; Photographic record (if applicable); Send email confirmation to Onesubsea immediately after collection; Update forecast spreadsheet. Deadlines (Maximum): Air - Day 2 (AM) / Day 3 (EUR/ASIA); Ocean - Day 6 (All Regions). Tools: Mobile app/carrier confirmation, Notification system, Email template.

Etapa 5: Confirmação de Chegada no Armazém PGL (Hub)

Responsável Principal: Coordenador de Armazém PGL (Hub).

Procedimentos: Recebimento e conferência detalhada (volume, quantidade, peso, embalagem); Documentação fotográfica de discrepâncias (se necessário); Avaliação de necessidade de repacking (se necessário); Comunicação imediata de discrepâncias à Onesubsea.

Prazos (Máximo): Air - Dia 5 (EUR/AM) / Dia 4 (ASIA); Ocean - Dia 10 (Todas as Regiões).

Ferramentas: Checklist de inspeção, Sistema de registro de discrepâncias, Câmeras.





Main Responsible: PGL Warehouse Coordinator (Hub). Procedures: Detailed receipt and inspection (volume, quantity, weight, packaging); Photographic documentation of discrepancies (if necessary); Assess repacking needs (if necessary); Immediate communication of discrepancies to Onesubsea. Deadlines (Maximum), Air - Day 5 (EUR/AM) / Day 4 (ASIA); Ocean - Day 10 (All Regions). Tools: Inspection checklist, Discrepancy registration system, Cameras.

Etapa 6: Entrega no Terminal (Porto/Aeroporto)

Responsável Principal: Analista de Operações PGL (Hub)

Procedimentos: Coordenação do transporte do armazém PGL para o terminal de embarque (porto/aeroporto); Confirmação de entrega no terminal dentro do cut-off; *

Prazos (Máximo): Air - Dia 6 (EUR/AM) / Dia 5 (ASIA); Ocean - Dia 15 (Todas Regiões).

Ferramentas: Sistema TMS, Comunicação com transportadoras e terminais.

Main Responsible: PGL Operations Analyst (Hub). Procedures: Coordinate transport from PGL warehouse to the shipping terminal (port/airport); Confirm delivery to the terminal within the cut-off; Deadlines (Maximum): Air - Day 6 (EUR/AM) / Day 5 (ASIA); Ocean - Day 15 (All Regions). Tools: TMS System, Communication with carriers and terminals.

Etapa 7: Confirmação a Bordo (COB) / Pré-Alerta e Documentos

Responsável Principal: Analista de Operações / Documentação PGL

Procedimentos: Obtenção da confirmação de embarque (COB); Envio de COB por e-mail com tracking; Compilação e verificação dos documentos de embarque; Preparação e envio do pré-alerta completo (detalhes da carga, ETA, Demurrage Free Time, etc.) para Onesubsea e Despachante.

Prazos COB (Máximo): Air - Dia 6 (EUR/AM) / Dia 6 (ASIA); Ocean - Dia 20 (EUR) / Dia 25 (AM) / Dia 22 (ASIA).

Prazos Pré-Alerta (Máximo): Air - Dia 7 (EUR/AM) / Dia 6 (ASIA); Ocean - Dia 20 (EUR) / Dia 25 (AM) / Dia 22 (ASIA).

Ferramentas: Sistema de tracking, Sistema de gestão documental, Template COB, Template Pré-Alerta.

Main Responsible: PGL Operations / Documentation Analyst. Procedures: Obtain shipment confirmation (COB); Send COB email with tracking; Compile and verify shipping documents; Prepare and send complete pre-alert (cargo details, ETA, Demurrage Free Time, etc.) to Onesubsea and Broker. COB Deadlines (Maximum): Air - Day 7 (EUR/AM) / Day 6 (ASIA); Ocean - Day 20 (EUR) / Day 25 (AM) / Day 22 (ASIA). Pre-Alert Deadlines (Maximum): Air - Day 6 (EUR/AM) / Day 6 (ASIA); Ocean - Day 20 (EUR) / Day 25 (AM) / Day 22 (ASIA). Tools: Tracking system, Document management system, COB Template, Pre-Alert Template.

Etapa 8: Acompanhamento do Trânsito

Responsável Principal: Equipe de Monitoramento PGL

Procedimentos: Monitoramento do status da carga via sistema de tracking; Verificação de desvios de rota ou atrasos; Comunicação proativa à Onesubsea sobre qualquer alteração na ETA; Atualização da planilha de follow-up.



Ferramentas: Sistema de tracking em tempo real, Alertas automáticos, Dashboard de monitoramento.

*Main Responsible: PGL Monitoring Team, Procedures: monitoring of cargo status via tracking system; Check for route deviations or delays; Proactive communication to Onesubsea regarding any ETA changes; Update follow-up spreadsheet. Tools:** Real-time tracking system, Automatic alerts, Monitoring dashboard.*

Etapas 9: Confirmação de Chegada no Destino (Brasil)

Responsável Principal: Analista de Operações PGL Brasil

Procedimentos: Confirmação da chegada efetiva no porto/aeroporto brasileiro; Verificação da disponibilidade da carga junto ao terminal/cia aérea; Comunicação imediata à Onesubsea e Despachante; Suporte ao processo de liberação alfandegária. Prazos (Máximo Chegada): Air - Dia 9 (AM/ EUR) / Dia 10 (ASIA); Ocean - Dia 45(EUR/AM) / Dia 60 (ASIA).

Garantias Pós-Chegada: FCL - Disponibilidade em 24h; LCL - Disponibilidade em 48h. Ferramentas: Sistema de monitoramento de chegadas, Contatos locais, Checklist de chegada.

Main Responsible: PGL Brazil Operations Analyst, Procedures: Confirm actual arrival at the Brazilian port/airport; Verify cargo availability with the terminal/airline; Immediate communication to Onesubsea and Broker; Support customs clearance process. Arrival Deadlines (Maximum): Air - Day 9 (EUR /AM) / Day 10 (ASIA); Ocean - Day 45 (EUR/AM) / Day 60 (ASIA). Post-Arrival Guarantees: FCL - Availability within 24h; LCL - Availability within 48h. Tools: Arrival monitoring system, Local contacts, Arrival checklist.

5.Cronograma Operacional Detalhado

5.1-Air Shipment - Europa (EUR)

Etapa (Step)	Descrição (Description)	Prazo Máximo (Max Deadline)	Responsável (Responsible)	Hub Principal (Main Hub)
1	Recebimento da SI	Dia 0	OSS	N/A
2	Confirmação Booking	Dia 1	PGL	N/A
3	Agendamento Coleta	Dia 1	PGL	N/A
4	Confirmação de Coleta	Dia 2	PGL	N/A
5	Chegada Armazém PGL	Dia 4	PGL	FRA / OSL / CDG



6	Entrega Terminal	Dia 5	PGL	FRA / OSL / CDG
7	COB / Pré-Alerta / Docs	Dia 6	PGL	N/A
8	Acompanhamento Trânsito	Contínuo	PGL	N/A
9	Chegada Destino (Brasil)	Dia 9	PGL	Brasil

5.2-Air Shipment - América (AM)

Etapas (Step)	Descrição (Description)	Prazo Máximo (Max Deadline)	Responsável (Responsible)	Hub Principal (Main Hub)
1	Recebimento da SI	Dia 0	OSS	N/A
2	Confirmação Booking	Dia 1	PGL	N/A
3	Agendamento Coleta	Dia 1	PGL	N/A
4	Confirmação de Coleta	Dia 2	PGL	N/A
5	Chegada Armazém PGL	Dia 5	PGL	MIA / IAH
6	Entrega Terminal	Dia 6	PGL	MIA / IAH
7	COB / Pré-Alerta / Docs	Dia 7	PGL	N/A
8	Acompanhamento Trânsito	Contínuo	PGL	N/A
9	Chegada Destino (Brasil)	Dia 9	PGL	Brasil

5.3-Air Shipment - Ásia (ASIA)

Etapas (Step)	Descrição (Description)	Prazo Máximo (Max Deadline)	Responsável (Responsible)	Hub Principal (Main Hub)
1	Recebimento da SI	Dia 0	OSS	N/A
2	Confirmação Booking	Dia 1	PGL	N/A
3	Agendamento Coleta	Dia 1	PGL	N/A
4	Confirmação de Coleta	Dia 2	PGL	N/A
5	Chegada Armazém PGL	Dia 4	PGL	PVG / HKG / KUL
6	Entrega Terminal	Dia 5	PGL	PVG / HKG / KUL
7	COB / Pré-Alerta /	Dia 6	PGL	N/A



	Docs			
8	Acompanhamento Trânsito	Contínuo	PGL	N/A
9	Chegada Destino (Brasil)	Dia 10	PGL	Brasil

5.4-Ocean Shipment - Europa (EUR)

Etapas (Step)	Descrição (Description)	Prazo Máximo (Max Deadline)	Responsável (Responsible)	Hub Principal (Main Hub)
1	Recebimento da SI	Dia 0	OSS	N/A
2	Confirmação Booking	Dia 4	PGL	N/A
3	Agendamento Coleta	Dia 4	PGL	N/A
4	Confirmação de Coleta	Dia 6	PGL	N/A
5	Chegada Armazém PGL	Dia 10	PGL	Thurrock / Grangemouth / Le Havre / Oslo
6	Entrega Terminal	Dia 15	PGL	Thurrock / Grangemouth / Le Havre / Oslo
7	COB / Pré-Alerta / Docs	Dia 20	PGL	N/A
8	Acompanhamento Trânsito	Contínuo	PGL	N/A
9	Chegada Destino (Brasil)	Dia 45	PGL	Brasil

5.5-Ocean Shipment - América (AM)

Etapas (Step)	Descrição (Description)	Prazo Máximo (Max Deadline)	Responsável (Responsible)	Hub Principal (Main Hub)
1	Recebimento da SI	Dia 0	OSS	N/A
2	Confirmação Booking	Dia 4	PGL	N/A
3	Agendamento Coleta	Dia 4	PGL	N/A
4	Confirmação de Coleta	Dia 6	PGL	N/A
5	Chegada Armazém PGL	Dia 10	PGL	Miami / Houston
6	Entrega Terminal	Dia 15	PGL	Miami / Houston





7	COB / Pré-Alerta / Docs	Dia 25	PGL	N/A
8	Acompanhamento Trânsito	Contínuo	PGL	N/A
9	Chegada Destino (Brasil)	Dia 45	PGL	Brasil

5.6-Ocean Shipment - Ásia (ASIA)

Etapa (Step)	Descrição (Description)	Prazo Máximo (Max Deadline)	Responsável (Responsible)	Hub Principal (Main Hub)
1	Recebimento da SI	Dia 0	OSS	N/A
2	Confirmação Booking	Dia 4	PGL	N/A
3	Agendamento Coleta	Dia 4	PGL	N/A
4	Confirmação de Coleta	Dia 6	PGL	N/A
5	Chegada Armazém PGL	Dia 10	PGL	Shanghai / Shenzhen / Hong Kong / Port Klang
6	Entrega Terminal	Dia 15	PGL	Shanghai / Shenzhen / Hong Kong / Port Klang
7	COB / Pré-Alerta / Docs	Dia 22	PGL	N/A
8	Acompanhamento Trânsito	Contínuo	PGL	N/A
9	Chegada Destino (Brasil)	Dia 60	PGL	Brasil

6.Conformidade e Qualidade

A PGL assegura a conformidade e a qualidade em todas as etapas do processo logístico.

6.1-Embalagens de Madeira (ISPM 15 / MAPA)

A PGL implementará um rigoroso processo para garantir a conformidade com a Instrução Normativa MAPA nº 32/2015 e ISPM 15 para todas as embalagens e suportes de madeira bruta em embarques para o Brasil:



- Verificação na Origem: Inspeção detalhada para garantir marcação IPPC correta, legível, durável e em pelo menos dois lados opostos (Símbolo, XX-000, HT/MB/DH).
- Comunicação Preventiva: Orientação aos fornecedores sobre os requisitos, distribuição de material informativo e alertas sobre proibição de etiquetas ou marcação manual.
- Monitoramento e Documentação: Registro fotográfico das marcações IPPC antes do embarque, documentação do tratamento e procedimentos de contingência para não conformidades.

PGL will implement a rigorous process to ensure compliance with MAPA Normative Instruction No. 32/2015 and ISPM 15 for all raw wood packaging and supports in shipments to Brazil:

- *Origin Verification: Detailed inspection to ensure correct, legible, durable IPPC marking on at least two opposite sides (Symbol, XX-000, HT/MB/DH).*
- *Preventive Communication: Guidance to suppliers on requirements, distribution of informative material, and alerts about the prohibition of labels or manual marking.*
- *Monitoring and Documentation: Photographic record of IPPC markings before shipment, treatment documentation, and contingency procedures for non-compliance.*

6.2-Metodologia de Cálculo de CO2e

A PGL implementará a metodologia Well-to-Wheel (WTW) para cálculo preciso das emissões de CO2e, conforme especificado na RFP:

- Fórmula Aplicada: Logistics CO² Emissions = $\sum$ (massa de bens (ton) × distância percorrida (km)) × Fator de Emissão do modo de transporte (kgCO2e/tons.km).
- Coleta de Dados: Massa precisa de cada embarque, distância exata percorrida em cada trecho, e fatores de emissão específicos por modo/veículo.
- Validação e Precisão: Dupla verificação dos dados, uso de fontes confiáveis para fatores de emissão e atualização regular.

PGL will implement the Well-to-Wheel (WTW) methodology for accurate calculation of CO2e emissions, as specified in the RFP:

- *Applied Formula: Logistics CO² Emissions = $\sum$ (mass of goods (ton) × distance traveled (km)) × Emission Factor of the transport mode (kgCO2e/tons.km).*
- *Data Collection: Precise mass of each shipment, exact distance traveled in each leg, and specific emission factors per mode/vehicle.*
- *Validation and Accuracy: Double-checking of data, use of reliable sources for emission factors, and regular updates.*



7.Procedimentos de Contingência

7.1-Atrasos na Coleta

Gatilho: Fornecedor não disponível após 3 tentativas

Ação: Notificação imediata ao analista OSS

Solução: Reprogramação coordenada com OSS e fornecedor

Responsável: Analista de Operações Regional

7.2-Discrepâncias na Carga

Gatilho: Diferenças de volume, peso ou condição

Ação: Documentação fotográfica e relatório detalhado

Solução: Consulta à OSS para instruções, possível repacking

Responsável: Coordenador de Armazém

7.3-Cancelamento/Alteração de Booking

Gatilho: Notificação da transportadora ou necessidade operacional

Ação: Busca imediata de alternativas

Solução: Rebooking prioritário, comunicação à OSS

Responsável: Analista de Operações por Modal

7.4-Atrasos no Trânsito

Gatilho: Notificação de atraso pela transportadora

Ação: Avaliação de impacto e alternativas

Solução: Comunicação à OSS, monitoramento intensificado

Responsável: Equipe de Monitoramento

7.5-Problemas na Chegada

Gatilho: Carga indisponível no prazo estabelecido

Ação: Contato imediato com terminal/armazém

Solução: Intervenção direta, escalação interna

Responsável: Analista de Operações Brasil

Trigger: Supplier unavailable after 3 attempts

Action: Immediate notification to OSS analyst

Solution: Rescheduling coordinated with OSS and supplier

Responsible: Regional Operations Analyst

Trigger: Differences in volume, weight, or condition

Action: Photographic documentation and detailed report

Solution: Consult OSS for instructions, possible repacking

Responsible: Warehouse Coordinator



Trigger: Notification from carrier or operational need
Action: Immediate search for alternatives
Solution: Priority rebooking, notification to OSS
Responsible: Modal Operations Analyst
Trigger: Delay notification from carrier
Action: Impact assessment and alternatives
Solution: Communication with OSS, intensified monitoring
Responsible: Monitoring Team
Trigger: Cargo unavailable within the established time
Action: Immediate contact with terminal/warehouse
Solution: Direct intervention, internal escalation
Responsible: Brazil Operations Analyst

8. Indicadores de Desempenho (KPIs)

8.1-KPIs de Prazo

Cumprimento de Prazos por Etapa: Meta 98%
 Tempo Médio de Resposta: Meta < 2 horas
 Pontualidade na Entrega: Meta 95%

8.2-KPIs de Qualidade

Precisão Documental: Meta 99%
 Taxa de Discrepâncias: Meta < 2%
 Satisfação do Cliente: Meta > 95%

Stage Deadline Compliance: Target 98%
Average Response Time: Target < 2 hours
On-time Delivery: Target 95%
Document Accuracy: Target 99%
Discrepancy Rate: Target < 2%
Customer Satisfaction: Target > 95%

8.3-Monitoramento e Relatórios

Relatório Semanal: Status de todas as cargas ativas
 Relatório Mensal: Análise de desempenho e KPIs
 Reunião Trimestral: Revisão estratégica e melhorias

Weekly Report: Status of all active shipments
 Monthly Report: Performance and KPI analysis
 Quarterly Meeting: Strategic review and improvements



8. Conclusão

A PGL Brasil reitera seu compromisso em fornecer um serviço logístico de excelência para a Onesubsea, alinhado às suas necessidades e expectativas. Este plano operacional detalhado, combinado com nossa expertise e infraestrutura, nos posiciona como o parceiro ideal para gerenciar eficientemente seus embarques internacionais, garantindo conformidade, visibilidade e cumprimento de prazos.

PGL Brazil reiterates its commitment to providing an excellent logistics service for Onesubsea, aligned with its needs and expectations. This detailed operational plan, combined with our expertise and infrastructure, positions us as the ideal partner to efficiently manage your international shipments, ensuring compliance, visibility, and adherence to deadlines.
